



Cosmetic Pipeline

Plataforma B2B de Gestión de Pedidos de Cosmética

Conectando distribuidoras y tiendas de cosmética — **Marzo 2026 · Versión v3.0**

Alejandro Rodas

Problemática y solución,
arquitectura tecnológica

Miguel Angel

Rodríguez

Plan de proyecto, fases y
cronograma

Alejandro Medina

Estimación de costes, recursos
humanos

Roberto Ruiz

Equipo, limitaciones,
especificaciones técnicas

Índice

1. Portada — Página 1
2. Índice — Página 2
3. Distribución del Trabajo — Página 3
4. El Problema — Página 4
5. Análisis de mercado — Página 5
6. Control de Versiones — Página 6
7. La Solución: Cosmetic Pipeline — Página 7
8. Arquitectura Tecnológica — Página 8
9. Plan de Proyecto: 11 Semanas — Página 9
10. Equipo del Proyecto — Página 10
11. Alcance: Incluido y Excluido — Página 11
12. Control del Proyecto y KPIs — Página 12
13. Estimación de Costes (MVP) — Página 13
14. Cierre — Página 14

Distribución del Trabajo

Alejandro Rodas

- Problemática y solución
- Arquitectura tecnológica
- Decisiones técnicas clave

Alejandro Medina

- Estimación de costes
- Recursos humanos
- Presupuesto y contingencias

Miguel Angel

Rodríguez

- Plan de proyecto
- Fases y cronograma
- Gestión de riesgos

Roberto Ruiz

- Equipo del proyecto
- Limitaciones técnicas
- Especificaciones técnicas
- Alcance del MVP

El Problema: Gestión Manual e Ineficiente

Las PYMES de distribución de cosmética en Madrid/España (3-15 empleados, 500k-2M€ facturación) gestionan pedidos de forma manual — email, teléfono, Excel — con procesos lentos y sin visibilidad real del estado del pedido.

3-5

Días de retraso

0%

Visibilidad de stock

Alta

Errores/duplicados

Nula


Trazabilidad

Análisis de Mercado y Empresa Objetivo

EMPRESA TIPO OBJETIVO

Tamaño 5-12 empleados	Facturación 800k€ - 1.5M€ / año	Ubicación Madrid y área metropolitana
Modelo Distribuidora de cosmética B2B (mayorista)	Clientes 50-150 tiendas/puntos de venta	

REALIDAD DEL MERCADO: GESTIÓN ANALÓGICA EN MADRID

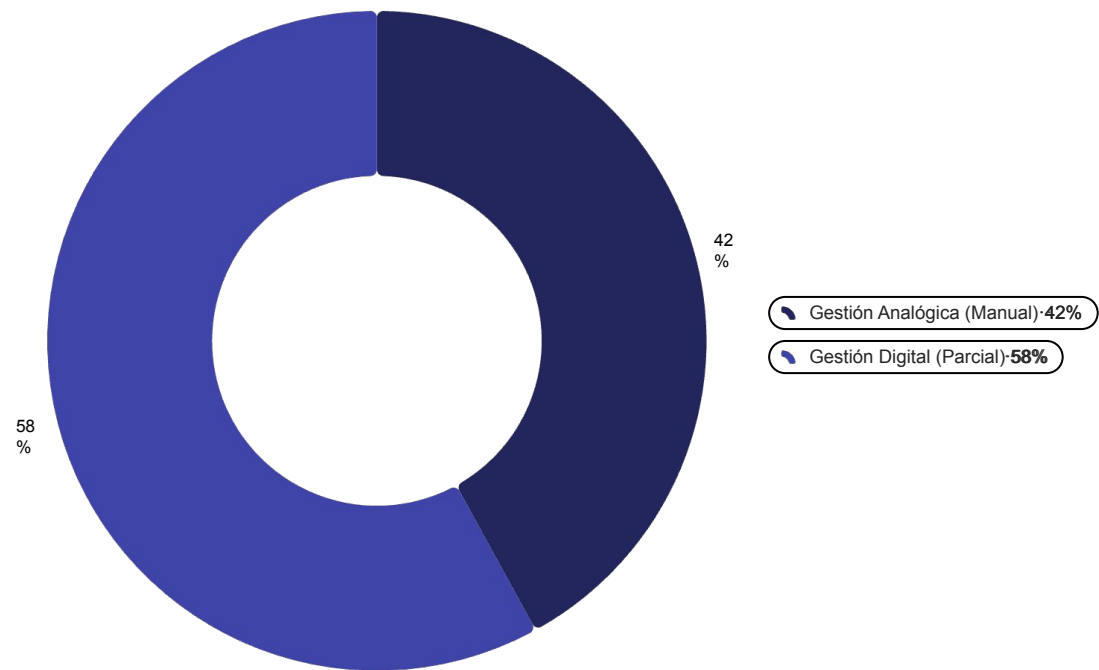

Fuente: Análisis de mercado cosmético B2B Madrid 2026

PERFIL DE EMPRESA LOGÍSTICA TÍPICA



Trabajadores
3-15



Tamaño
500-2000m²



Facturación
500k-2M€



Tipo
PYME/familiar

Control de Versiones

Version	Fecha	Cambios
v1.0	Feb 2026	Versión inicial
v2.0	Mar 2026	Actualización alcance/costes
v3.0	Mar 2026	Actualización con feedback del PM

"Documento en evolución. Última actualización: Marzo 2026"

La Solución: Cosmetic Pipeline

Plataforma B2B web que centraliza catálogo, pedidos, trazabilidad y comunicación entre distribuidoras y tiendas de cosmética.



Tiendas / Puntos de Venta

Pedidos B2B con catálogo digital, carrito inteligente y seguimiento en tiempo real.
Gestión de incidencias y devoluciones.



Distribuidoras

Confirmación de stock y gestión de expediciones vía API/CSV/EDI. Sincronización automática de catálogo y precios.



Operaciones / Backoffice

Alta de organizaciones, gestión de incidencias, monitorización y reporting de KPIs.




Volumetrías MVP: 50-100 tiendas · 5.000-10.000 SKUs · 20.000-30.000 pedidos/año · 100-200 usuarios simultáneos

Alcance del Proyecto (MVP)

- Desarrollo de plataforma web B2B
- Integración con 1 distribuidora piloto
- Formación inicial del cliente
- Documentación técnica y de usuario
- Soporte durante 3 meses post-lanzamiento
- Reuniones de seguimiento semanales

Arquitectura Tecnológica

Cosmetic Pipeline actúa como núcleo central de integración entre todos los actores del ecosistema de cosmética B2B, garantizando una comunicación fluida mediante múltiples protocolos.

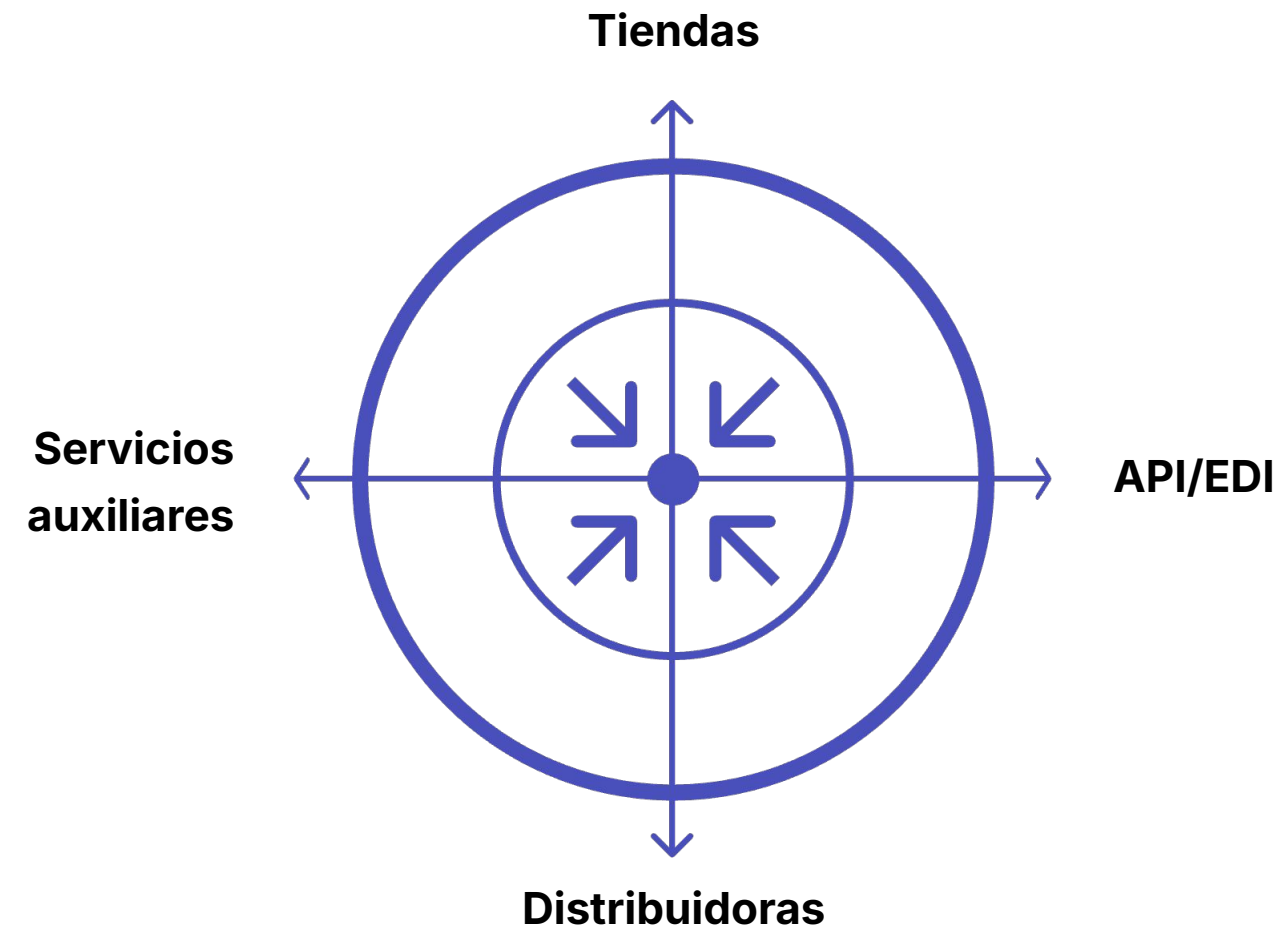

Integraciones


- API REST (distribuidoras)
- Importación/Exportación CSV
- Protocolo EDI estándar
- Webhooks de notificación

Servicios

- Pasarela de pagos
- Notificaciones (Email/SMS)
- Monitorización Cloud
- CI/CD Automatizado

Plan de Proyecto: 11 Semanas

Modelo de desarrollo **Agile/Iterativo** con entregas incrementales y UAT por fase. Plazo total: **~2,5 meses**.

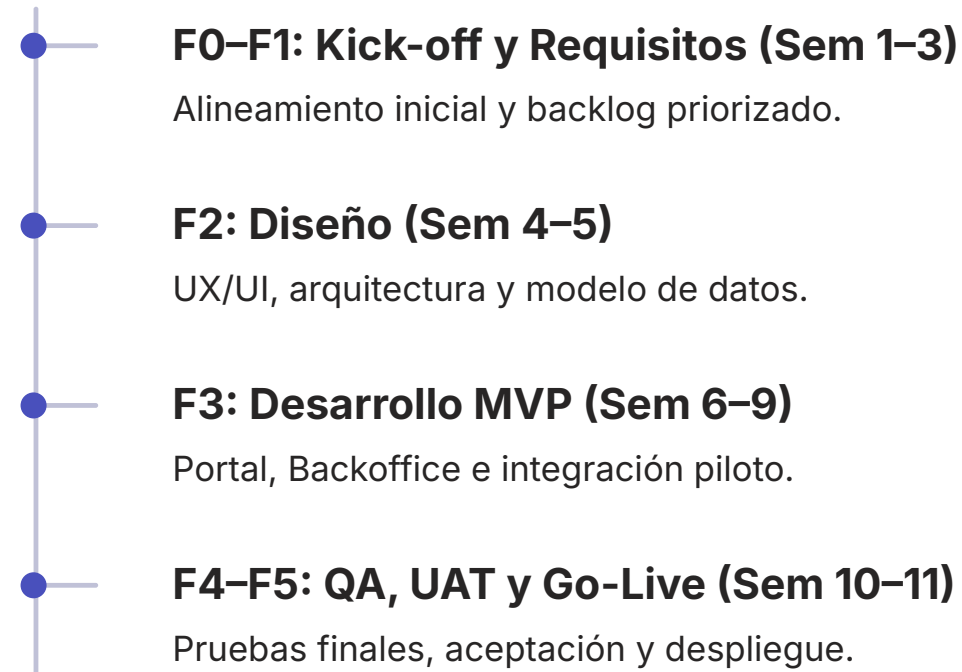

Hitos Clave

Sem 3: Backlog y arquitectura aprobados

Sem 6: Demo funcional (checkpoint)

Sem 10: UAT y aceptación firmada

Sem 11: Go-Live en producción

Equipo del Proyecto

Equipo Proveedor (Desarrollo)

PM Planificación y gestión	BA Requisitos y backlog
UX/UI Diseño de interfaz	Tech Lead Arquitectura y stack
Backend (x2) API e integraciones	Frontend Portal web
QA Testing y UAT	DevOps Cloud y despliegue

Equipo Cliente (Participación)

- **Negocio:** Valida requisitos y UAT
- **Operaciones:** Flujos y manuales
- **Distribuidora:** Integración piloto
- **IT:** Accesos y seguridad

📌 Las funciones pueden ser consolidadas según la estructura del cliente.

Alcance: Incluido y Excluido

✓ Incluido en el MVP

- Portal web B2B: catálogo, búsqueda, pedido y trazabilidad
- Backoffice: gestión de usuarios, pedidos e incidencias
- Integración con 1 distribuidora piloto
- Notificaciones automáticas por email
- Exportación y APIs básicas de reporting

✗ Fuera de Alcance

- Gestión física de almacenes (WMS)
- Negociación comercial en la plataforma
- Soporte 24×7 y gestión operativa
- Migración de datos históricos
- Integraciones multi-distribuidora

📄 **Control de cambios:** Las ampliaciones se gestionan mediante Solicitud de Cambio (CR) con análisis de impacto y aprobación formal.

Control del Proyecto y KPIs

Seguimiento continuo mediante indicadores clave y herramientas colaborativas para garantizar la calidad y plazos.

Indicadores de Gestión

- **% Avance por fase:**
Semanal vs. planificado
- **Requisitos entregados:**
Aceptados en UAT
- **Defectos abiertos:**
Clasificados por
severidad
- **Desviación de coste:**
Real vs. estimado
- **Satisfacción cliente:** Validación por fase

Herramientas del Proyecto

- **Jira / Trello:** Gestión de
backlog y sprints
- **GitHub:** Repositorio y
CI/CD (Actions)
- **Slack + Reuniones:**
Comunicación y
seguimiento
- **Confluence / Docs:**
Documentación técnica

Estimación de Costes (MVP)

Alcance	Descripción	Coste (€)	Horas
Alcance Base	Portal y Backoffice	3.500	280
Integración	1 Distribuidora	1.000	80
Reporting	Notificaciones/APIs	400	32
Infraestructura	Cloud/Certificados	300	-
Formación Cliente	Curso y documentación	400	16
Transporte y Reuniones	Desplazamientos y reuniones presenciales	250	-
Comida y Logística	Almuerzos en reuniones y logística	150	-
Contingencia	Buffer (10%)	520	40
TOTAL		6.520 €	~408 h

Incluye costes de proyecto (formación, transporte, reuniones) además de desarrollo. Estimación realista para MVP con 1 distribuidora piloto.

Estimación basada en complejidad. Ampliaciones de alcance requieren revisión técnica.

Stack Tecnológico

Desarrollo

Node.js, Python, React 18+

Datos y Cloud

PostgreSQL 15+, AWS/Azure

DevOps & Tools

GitHub Actions, Google Workspace

Cosmetic Pipeline

Plataforma B2B de Gestión de Pedidos de Cosmética

Equipo	Versión	Institución
A. Rodas, M. Angel, A. Medina, R. Ruiz	v3.0 · Marzo 2026	Proyecto de Ingeniería — UEM
